澄安物业居家适老化改造业务市场进入研究计划书

研究杭州、宁波老年家庭的购买需求与服务交付条件，形成物业公司进入改造业务的方案。

委托对象 | 澄安物业（虚构）　　2026年10月29日 · v3

第4周阶段建议 · 第7周完整报告

拟研究业务：居家安全改善与卫生间局部改造

家庭购买

合作交付

经营回报



研究方案目录

从澄安物业的新业务决定出发，依次查看研究安排、成果、团队和商务条件。

01 客户需求理解与评估

将物业公司的新业务目标，拆成家庭购买、服务交付和经营回报三个相互关联的判断。 · 第3页

02 总体研究思路

先核实家庭付费与接受施工的条件，再比较合作方式，形成进入建议及试点安排。 · 第7页

03 研究方法设计

用公开资料、家庭访问、社区问卷和服务商访谈取得不同层次的材料，再进入经营测算。 · 第10页

04 研究框架与成果交付

围绕市场进入的具体决定组织最终报告，并交付能够继续调整的测算与试点文件。 · 第17页

05 项目团队与协作安排

配置研究、执行、分析和工程顾问岗位，并明确物业公司与研究团队的配合事项。 · 第20页

06 研究周期与商务安排

第4周提交阶段建议，第7周提交完整报告；正式执行前保留招募、预访谈及修订时间。 · 第23页

01

客户需求理解与评估

将物业公司的新业务目标，拆成家庭购买、服务交付和经营回报三个相互关联的判断。

物业公司拟拓展的改造业务

五项市场进入决定

把资源用于影响立项的判断

客户需求理解 | 物业公司拟拓展的改造业务

澄安物业希望把社区服务关系转化为家庭改造订单，研究需要判断这项业务值得进入的条件。

本项目为模拟委托。澄安物业是一家虚构的区域物业公司，假设在杭州、宁波各管理4个住宅小区，共服务约6,000户家庭，其中约1,200户有60岁及以上成员。公司已有物业管家和日常维修人员，尚无独立的适老化改造业务、专业评估团队或稳定施工合作商。上述数量用于检验方案，实际立项时须以物业台账核对。

管理层拟通过新增家庭服务提高单户经营收入，同时保持物业服务口碑。计划研究的业务包括扶手、防滑、照明等居家安全改善，以及卫生间局部改造；服务对象为杭州、宁波的老年家庭，老人可能是使用者，子女可能参与选择并支付费用。

本轮研究应帮助管理层决定是否试营适老化改造、优先服务哪些家庭、推出哪些服务组合，以及由公司承包交付还是向专业服务商推荐客户。研究还需估算试点所需人员、资金与订单量，明确扩大投入应满足的经营条件。

现有基础

物业管家可联系住户，维修记录有助于识别常见居住问题。

经营缺口

服务信任能否转化为付费、施工责任由谁承担、售后成本有多高，均需研究。

拟作决定

确定首批小区、服务组合、合作方式及试点投入上限。

客户需求拆解｜五项市场进入决定

从家庭选择到试点投入逐项展开，使研究成果能够直接用于新业务立项。

经营诉求	具体研究内容	管理层将据此作出的决定
找到可成交的首批家庭	比较近期已改造、正在考虑及明确暂不改造的家庭；识别谁提出、谁付款、谁反对，以及改造触发事件。	先服务哪类家庭，先进入哪些小区。
形成家庭愿意购买的服务	比较安全改善和卫生间局改的实际问题、施工干扰、报价接受方式及保修要求。	首批服务包含哪些项目，哪些服务暂不提供。
选择适合物业公司的经营方式	比较客户推荐、联合服务和承包交付的收入来源、人员要求、责任及合作商条件。	由谁签合同、收款、施工和处理售后。
核实投入与回报	测算可接触家庭、获得线索、上门评估和成交的过程，并加入人工、施工、售后和资金占用。	试点投入多少，达到什么订单量才能持续经营。
安排试点和扩大业务的条件	结合小区特点、供给覆盖和管理资源，设计首批试点、观察指标及继续投入条件。	在哪些小区试行、观察多久，以及何时扩大或收缩投入。

研究深度与关键条件｜把资源用于影响立项的判断

本轮能够形成服务与经营方案；真实成交率和长期售后成本需通过后续试点继续验证。

优先级与求证难度	本轮回答深度及咨询成果	决定回答深度的关键条件
首批家庭与购买障碍 **优先1｜中等**	深入分析20户家庭的购买过程，结合160份社区问卷比较需求分布，形成目标家庭及沟通重点。	须接触到老人、付款人及不愿改造的家庭；只访问主动报名者会高估购买意愿。
服务与合作方式 **优先1｜较高**	比较服务项目、合作责任和报价内容，提出首批服务组合及合作商选择条件。	服务商须提供可核对的报价和合同条款；顾问需判断典型住宅的施工限制。
订单、利润与现金需求 **优先1｜较高**	给出不同成交、客单价和返修条件下的经营结果及试点投入上限建议。	物业台账需能按家庭去重；成本须覆盖材料、人工、到场、售后及管理。成交率暂以情景参数表示。
长期效果及全市可复制性 **优先2｜高**	本轮设计试点评估办法，提出扩大业务前必须验证的条件。	七周研究不包含真实施工交付及长期跟踪；持续收益和全市推广能力由后续试点检验。

研究优先回答首批客户、服务组合与经营方式，保留两市对照。面向养老机构的工程招标、全屋重建和重度失能家庭的专业照护改造不纳入本轮范围。这样可把访问和测算资源集中到澄安物业近期能够尝试的家庭业务。

02

总体研究思路

先核实家庭付费与接受施工的条件，再比较合作方式，形成进入建议及试点安排。

将家庭需求与交付成本共同纳入进入判断

研究结果决定首阶段经营安排

研究思路｜将家庭需求与交付成本共同纳入进入判断

家庭愿意购买、物业公司能够组织交付、订单能够形成经营收益，三项条件需要同时成立。

先明确家庭真正需要购买的服务	读取政策与本地服务供给，访问老人及付款人，比较改造经历、目前替代办法和施工顾虑。由此形成候选服务组合，避免先设计套餐再寻找需求。 →
再检验物业公司能够承担的工作	访谈施工商、评估人员和社区渠道，比较推荐客户与承包交付的人员、合同及售后要求。将具体服务项目交由顾问核对施工限制，识别需要外部合作的环节。 →
把购买条件与交付安排放进同一测算	以实际可接触的家庭为起点，结合服务报价及人员安排，比较不同成交和返修条件下的利润与现金需求。研究结果将决定首批小区、经营方式和试点投入。 →

综合形成建议

形成适老化改造业务进入方案

家庭研究负责解释购买过程，问卷用于描述社区样本中的需求与差异，服务商研究提供供给及费用依据。三类材料相互核对后再提出经营建议；家庭愿意接受上门评估的比例，不直接作为最终成交率。

进入方式比较｜研究结果决定首阶段经营安排

把家庭购买意愿、施工组织能力与订单贡献组合判断，分别提出自营、合作或暂缓方案。

澄安物业进入方式选择

家庭愿意付费，且公司具备交付条件

若服务方案获目标家庭接受，合作施工和售后责任明确，单笔贡献足以支持必要人员，则设计小规模承包交付试点，并设资金投入上限。

家庭存在需求，但公司不宜承担施工责任

若家庭重视物业推荐，而公司缺少工程管理与售后能力，则比较转介服务商、收取推荐服务费或联合服务的方案；核实服务费来源及投诉处理责任。

购买阻力或成本使试点难以成立

若家庭主要依赖免费服务、拒绝施工，或合理收费无法覆盖交付成本，则建议暂缓该服务组合，转向范围更小的安全改善服务，或停止本轮进入。

选择依据将在第4周阶段报告中首次比较，第7周用完整材料修订。若需求主要来自政府采购项目，本项目将把它列为另一类业务机会，另行研究招标资格和回款条件，不并入家庭自费业务的收入预测。

03

研究方法设计

用公开资料、家庭访问、社区问卷和服务商访谈取得不同层次的材料，再进入经营测算。

拆分自费需求和补贴需求

还原一次购买决定

检验服务组合与购买障碍的分布

行业与地方市场研究｜拆分自费需求和补贴需求

先核对当地政策与服务供给，再估算物业公司可触达的市场，避免把老龄人口直接换算成销售额。

01

核对政策对家庭支出的影响

查阅现行省、市、区政策，记录适用家庭、商品与材料目录、人工是否补贴、申请流程及资金期限。基准经营情景按无补贴测算，已核实的补贴单独计算。

02

比较两市服务供给和成交条件

收集两市各6家服务主体的公开服务范围、报价、保修与渠道资料，重点核对其中3家施工或改造服务商。按同一项目清单拆分材料、人工、到场及售后费用。

03

从实际可接触家庭估算机会

以8个在管小区经核实的家庭台账为基础，扣除不适合或无法接触的家庭，再建立评估与成交情景。两市人口和住房资料仅用于判断外部扩展条件。

预研已核实：浙江2025年规则按合格物品与材料价格的30%核定补贴，每户上限2万元，人工费用不在补贴内，政策适用期截至2025年12月31日。这说明家庭支付金额和服务商收入必须分别计算。2026年的具体可用政策将在第一周重新核实。[S01、S02]

家庭深访与入户观察｜还原一次购买决定

20户正式家庭覆盖已改造、考虑改造和暂不改造三类经历，其中12户进入住宅观察。

家庭状态	杭州	宁波	重点追问
近两年已改造	3户	3户	购买触发事件、比较方式、实付费用、施工及售后经历。
一年内考虑改造	4户	4户	老人和子女分歧、接受哪些项目、价格与施工的取舍。
明确暂不改造	3户	3户	现有替代办法、拒绝原因，以及可能改变决定的条件。

每市10户，尽量使物业在管小区与外部社区各占一半；兼顾独居、与配偶居住和与子女居住的家庭，并记录实际覆盖。家庭为分析单位，老人和子女共同参加时仍计1户。正式20户与160份问卷不重复；2户预访谈另计，不混入正式数量。

每户访问75—90分钟。12户入户观察覆盖两市各6户，按通行、洗浴、照明及日常使用过程记录问题；另8户采用在线视频。先请老人描述日常困难，再请实际付款人复述选择过程，以减少两人互相代答。招募按生活能力及实际需求筛选，由技术顾问确认研究适用范围；采集图片或录音前取得同意，交付使用匿名编号。[S03]

社区问卷｜检验服务组合与购买障碍的分布

160份有效问卷用于比较所调查社区的家庭需求，重点观察价格、施工和服务信任如何影响选择。

01

样本覆盖两市及两种社区关系

杭州、宁波各80户；每市2个在管小区、2个外部社区，每社区20户。访问家庭中参与改造决定的成年人，家庭须有60岁及以上成员，同一家庭只保留一份。

02

用具体服务描述代替泛泛意向

问卷控制在10—12分钟。先记录居住问题与既有支出，再展示两类服务的项目范围、施工时长及分别列示的材料和人工价格，比较选择、拒绝理由和愿意进一步了解的内容。

03

按样本来源核查回答差异

先做8份问卷预试，不计入正式160份；正式回收核查重复家庭、逻辑矛盾、异常时长和配额完成情况。分析按城市及社区关系比较，基础表列出每项实际有效样本数。

问卷为社区定向招募，每社区按统一规则联系有老年成员的家庭，覆盖不同楼栋和联络时段，并记录拒访；由研究团队访问，不由物业管家代填。统计范围为所调查的8个社区，其中4个在管小区与4个外部社区，用于比较来源差异。报价条件采用第二周服务商核对后的项目清单；愿意了解、愿意预约和已支付费用分别记录，经营模型中的成交率仍以情景表示。

服务商与内部访谈｜核对履约条件和费用

8场外部访谈与4场内部访谈分别补充供给条件和公司能力，避免只依据公开宣传制定合作方案。

对象与场次	取得的具体材料	分析与核对方式
施工及改造服务商3场	典型项目报价、采购和施工安排、返修处理、合同与保修条款。	至少取得2份同范围报价；把材料品牌、人工、运输和售后逐项对齐。
社区及养老服务渠道3场	家庭转介过程、客户顾虑、结算方式及合作约束。	区分政府采购、公益项目和家庭自费订单，分别记录付款主体。
评估或工程专业人员2场	常见住宅限制、评估事项、验收与维护要求。	由项目技术顾问核对候选服务范围，列出需要持证专业方承担的工作。
澄安物业内部人员4场	业务负责人、城市经理、维修负责人和财务人员的岗位投入及既有服务成本。	将可投入人员、现有能力和必须外采的工作逐项对应。

每场60—75分钟，采用统一比较提纲并保留书面报价或受访者确认的纪要。外部受访者自报的订单和利润单独标明出处；取不到凭证时，以可核实的项目报价测算，不使用自报收入估计市场份额。项目顾问的4人天另用于研究设计、典型问题审阅和服务方案复核，不与受访者酬谢重复计费。

经营情景模型｜从可接触家庭推到订单与现金

按客户推荐和承包交付分别计算收入与成本，明确支持试点持续运行所需的订单量。

先估算订单

可接触且适合服务的家庭数 × 线索形成比例 × 上门评估比例 × 成交比例。各比例明确分母，按小区和服务组合计算，再汇总。

→

再计算单笔贡献

承包交付按不含税收入，扣除材料、外包施工、到场交通、支付费用及预期售后成本；客户推荐按实际服务费收入，扣除获客与协调成本。

→

最后安排试点资金

月度订单贡献扣除新增固定人员和管理支出，形成经营收益；结合预收、向供应商付款和售后支出日期，估算最大资金缺口。

模型提供保守、基准和较好三种情景，重点调整成交比例、平均客单价、返修频率与单次处理成本。家庭问卷用于解释参数选择，服务商报价和公司资料用于取值；在未开展真实试销前，情景结果只用于决定试点规模。

交付的测算表保留输入区、公式及来源说明。管理层可据此比较两种经营方式，并观察订单不足或返修增加时，试点需要压缩哪些投入。

材料分析与核查｜把分歧转成具体解释

将家庭经历、问卷选择和服务商条件放在同一服务项目下比较，再形成有依据的建议。

01

按家庭决策过程编码

深访按触发事件、使用困难、付款安排、老人接受程度、施工顾虑、服务信任和拒绝原因整理；另列反例，保留匿名原话和材料位置。

02

比较定量结果与具体经历

按城市、社区关系及服务类别交叉查看问卷，区分样本数较少的分组。若问卷意愿高而深访拒绝付款，回看价格呈现、受访者身份与付款条件。

03

修订服务方案和经营假设

将分歧带回服务商报价或家庭补访，修订服务组合、合作分工与测算参数。补访最多4户次，针对已访家庭核实，不计为新增正式家庭。

高级研究员完成首轮分析，项目经理复核全部核心结论及至少4户访谈编码；分析员重算样本基数、模型公式和报价。技术顾问检查服务范围和工程条件。研究访问形成商业需求资料，专业设计和施工验收由后续具备相应能力的服务方承担。

04

研究框架与成果交付

围绕市场进入的具体决定组织最终报告，并交付能够继续调整的测算与试点文件。

从市场条件展开到试点方案

形成可继续使用的立项材料

最终研究报告框架｜从市场条件展开到试点方案

最终报告以六个相连板块组织，逐步回答目标家庭、服务内容、经营方式和投入安排。

报告板块	研究内容与下一级分析	主要分析成果
1. 两市市场与政策条件	家庭自费、补贴支持与政府采购分开；比较人口与住房特点、本地供给及在管小区可触达范围。	市场条件比较及物业渠道机会测算。
2. 目标家庭与购买过程	比较改造状态、老人和付款人的关系、触发事件、拒绝理由与服务信任。	目标家庭分组及购买过程图。
3. 服务组合与报价接受	比较居家安全改善和卫生间局改；对照家庭问题、施工干扰、服务商报价与保修要求。	首批服务组合、收费项目及暂缓项目建议。
4. 合作商与履约安排	比较推荐客户、联合服务和承包交付；逐项安排评估、签约、施工、收款和售后。	合作方式比较及责任分工图。
5. 经营情景与资金需求	按服务组合测算订单、单笔贡献、固定费用、返修和月度资金占用。	可调参数模型及影响收益的关键条件。
6. 试点与后续投入	选择小区和服务项目，安排90天试点指标、管理职责和继续投入条件。	试点方案与管理层进入建议。

成果交付与验收｜形成可继续使用的立项材料

阶段报告支持提前安排试点准备，完整报告和测算附件支持正式确定投入与合作方式。

交付材料	内容与用途	时间及验收重点
阶段建议报告 **HTML + PDF**	已完成材料的初步判断、两种经营方式的比较、尚待核实事项及提前可做的准备。	11月27日；区分已有发现与后续待判断事项。
完整研究报告 **Markdown + HTML + PDF**	按六个报告板块展开分析，保留来源、样本解释和服务方案依据；管理层可据此确认试点范围。	12月11日初稿，12月18日终稿；五项经营需求均有对应分析。
经营情景测算表 **可编辑Excel**	输入、假设、公式、来源和三种情景；支持调整订单、费用及资金安排。	随完整报告；公式可复算，收入、贡献、利润和现金分别呈现。
试点方案及研究附件	90天试点设计、服务商比较表、匿名问卷数据与编码说明、家庭主题分析表及来源索引。	随完整报告；试点责任及判断条件清楚，附件可追溯。

本次研究包含一次管理层汇报和一轮集中修订。验收依据约定研究范围、有效样本、分析可追溯性和模型可用性；试点实际施工、销售运营及90天跟踪不在本次研究费用内。

05

项目团队与协作安排

配置研究、执行、分析和工程顾问岗位，并明确物业公司与研究团队的配合事项。

研究与工程判断分别负责

把资料和访问安排落实到日期

项目团队配置｜研究与工程判断分别负责

拟配置五类岗位，覆盖需求研究、现场执行、经营测算和服务方案复核。

拟配置岗位	投入人天	承担工作与能力要求
项目总监	8	负责需求评估、方法及最终判断复核；需有新业务研究和管理层沟通经验。
项目经理	18	负责招募协调、进度、外部访谈和报告整合；需能管理两市执行与商业报价。
高级研究员	24	负责家庭访谈、现场观察、主题分析与服务方案；需具备家庭研究及中老年受访者沟通能力。
分析员	20	负责问卷、现场记录、资料整理、模型和数字核对；需具备数据分析及成本测算能力。
适老化工程顾问	4	负责工具、住宅问题、候选服务及施工条件审阅；需有相关工程或服务项目经验。

人员姓名与履历在采购确认时提交。各岗位按研究阶段投入，高级研究员与分析员共同完成入户访问，项目经理主持外部及内部访谈，项目总监复核阶段与最终建议。约定任务投入74人天，其中6人天用于改约、补证及修订；本方案采用分阶段服务，七周全程专属服务需另行约定。

双方配合事项｜把资料和访问安排落实到日期

澄安物业提供业务资料并协调在管小区，研究团队负责外部招募、材料核查及访问执行。

需要落实的事项	提供方与时间	完成标准及未到位时的处理
在管小区家庭统计与物业服务记录	澄安项目联系人；11月5日前	提供按家庭去重的数量、老人家庭识别口径及已有维修类别。若老人信息不足，先核对可接触家庭总数，机会测算用区间。
现有岗位、成本与合作资料	财务及维修负责人；11月6日前	提供可投入人员、工资负担、外包及已有服务成本。缺项按情景估算并逐条标出。
社区联系人及招募安排	物业城市经理与研究项目经理；11月6日前	落实每市2个在管小区的联系人及外部社区渠道；11月12日前确认首批家庭的具体时段。
候选服务商与访谈时间	研究项目经理；11月12日前	确认8场外部访谈和4场内部访谈；取得至少2家服务商的同范围报价。
研究工具与隐私安排	研究团队；11月12日前双方确认	提交修订提纲、问卷及同意说明；联系方式单独保存，物业人员不旁听家庭评价。

11月9日若外部社区渠道尚未落实，项目经理当天启用已询价的独立招募服务，并同步调整预约。费用在本次招募预算内；若11月13日仍无法接触外部家庭，阶段报告须单列来源缺口，并由双方确认缩小解释范围或延后相应结论。

06

研究周期与商务安排

第4周提交阶段建议，第7周提交完整报告；正式执行前保留招募、预访谈及修订时间。

先取得材料，再形成经营建议


每次确认都有对应材料与负责人

专业服务费与岗位投入

七周执行周期｜先取得材料，再形成经营建议

两周用于招募及工具准备，正式访问分批展开，并在报告分析前保留补访与改约时间。

具体工作与阶段成果

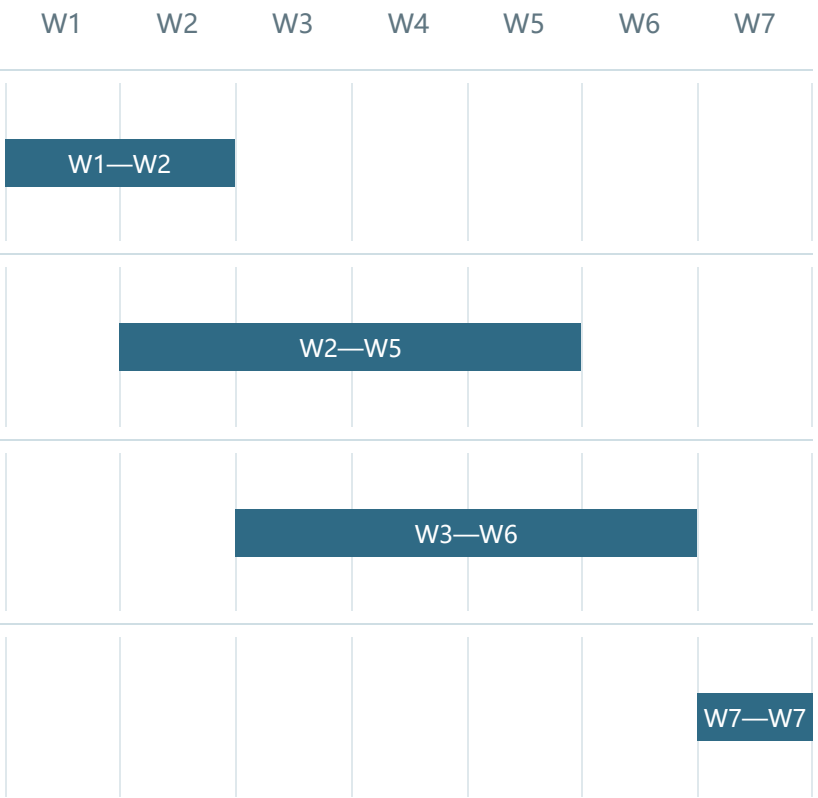

第1—2周｜11月2—15日

公开资料与内部访问；落实两市渠道、家庭筛选及访问预约；11月10—11日预访谈、11月12日问卷预试，当日完成工具修订与确认。

第2—5周｜11月13日—12月4日

完成20户正式家庭、160份有效问卷及8场外部访谈；入户安排跨周进行，晚间及周六优先邀请需陪同的子女；12月2—4日留作改约与补访。

第3—6周｜11月16日—12月11日

随材料形成主题分析与报价比较；11月27日交阶段建议，12月7—11日完成全量分析、经营模型和完整初稿。

第7周｜12月14—18日

12月14日接收集中意见，12月16日管理层汇报，12月18日交终稿及附件；该周已计入报告复核与修订工作。

模拟启动日为2026年11月2日。第4周阶段报告按11月26日材料截点编制，计划覆盖14户正式家庭、至少120份有效问卷、6场外部及4场内部访谈；完整样本在第五周完成。阶段建议用于决定试点准备，不在材料未齐时提前锁定最终服务价格和投入。

阶段确认节点 | 每次确认都有对应材料与负责人

把工具、访问进度、经营假设及报告意见分别确认，避免最后一周重新讨论研究范围。

日期	研究团队提交或完成	澄安物业配合与完成标志
11月5日 周四	需求范围、资料核对表、拟调研社区名单。	项目联系人确认五项经营需求及家庭数据口径。
11月12日 周四	预访谈纪要、修订问卷及提纲、首批访问日程。	城市经理确认联系人、进出安排及已预约家庭时段。
11月20日 周五	已完成样本结构、采购障碍与服务商报价比较。	业务负责人核对服务项目和公司可投入人员。
11月27日 周五	阶段建议、候选经营方式及剩余材料计划。	管理层于11月30日前确认需重点深化的方案，未回复则按原范围继续。
12月4日 周五	正式访问与问卷完成情况、经营模型参数表。	财务及维修负责人核对成本、合作条件和缺项。
12月11日 周五	完整报告初稿、测算表及90天试点设计。	项目联系人12月14日前提交一份合并意见。
12月16日 / 18日	16日汇报，18日提交终稿及文件清单。	管理层确认事实修订；按交付清单核对文件、公式与研究覆盖。

研究报价｜专业服务费与岗位投入

专业服务费235,800元，覆盖74个约定任务人天、阶段汇报及一轮集中修订。

岗位	人天	单价（元 / 人天）	金额（元）	服务内容
项目总监	8	5,300	42,400	需求设计、关键复核及管理层汇报
项目经理	18	3,700	66,600	招募协调、内外部访谈及报告整合
高级研究员	24	3,000	72,000	家庭深访、现场观察及主题分析
分析员	20	2,200	44,000	问卷、记录、数据分析及经营测算
工程顾问	4	2,700	10,800	研究工具和服务方案的技术复核
专业服务费小计	74	—	235,800	岗位数量与执行方案一致

五类岗位按研究进程分阶段投入，单价包含约定研究及组织服务。项目经理、高级研究员、分析员各预留2人天，用于改约、补证和修订；这6人天已包含在74人天中。各岗位任务数量与执行方案一致。

研究报价｜直接支出、税费与付款安排

完整研究方案含税报价294,383.20元，保留两市全部样本与七周交付周期。

直接支出项目	数量与单价	金额（元）
家庭招募及酬谢	入户12户×800元；线上8户×500元；预访谈2户及替补2户各×800元	16,800
外部专家访谈酬谢	8场×1,000元；内部访谈不付酬谢	8,000
社区问卷及预试	160份有效量×50元＋8份预试×100元；含招募、平台及基础质检	8,800
两市差旅与现场餐费	铁路8人次×240元＋住宿4间夜×450元＋交通8天×300元＋餐费16人天×100元	7,720
录音整理工具	1项×600元；人工整理已含在岗位投入中	600

专业服务费235,800元＋直接支出41,920元＝不含税277,720元；本次模拟按6%计税16,663.20元，含税合计294,383.20元。实际开票口径在采购时确认。

建议付款：启动40%（117,753.28元）、阶段报告40%（117,753.28元）、终稿验收20%（58,876.64元）。报价有效至2026年11月12日。直接支出按约定范围固定包干；新增城市、样本或修订轮次另行确认。计划于11月2日开工，确认较晚时同步调整日期。

预研来源与方案使用方式

公开资料用于明确调研边界和应核实的条件，计划中的市场与经营结论由后续研究形成。

来源与日期	已经读取的内容	对研究方案的具体作用
**S01	浙江省实施细则 2025年2月14日**	2025年合格材料补贴30%，每户上限2万元；明确申领与施工合同要求。	拆分家庭自费与补贴情景，第一周核实现行政策。
**S02	浙江省政策解读 2025年2月14日**	人工不补贴；政策期限至2025年12月31日，资金使用情况影响执行。	报价比较分别列材料、人工与其他费用，不把旧政策当作当前可用条件。
**S03	MZ/T 218—2024 2024年6月28日**	评估涵盖老人、家庭、居住环境与需求，方案需多方确认，并有验收要求。	入户提纲覆盖实际居住过程；技术顾问审核服务范围与施工条件。
**S04	宁波市民政局告知书 2024年9月13日**	强调尊重家庭意愿、服务合同、质量保修及企业服务条件。	服务商访谈核对合同、售后及报价；历史补贴比例不进入本轮预测。

S01 · 浙江省2025年居家适老化改造实施细则

S02 · 浙江省2025年实施细则政策解读

S03 · 民政行业标准：老年人居家环境适老化改造通用要求 MZ/T 218—2024

S04 · 宁波市居家适老化改造市民及企业告知书

以家庭的购买条件确定业务入口

将需求、服务交付和经营测算放在一起，形成可以据此安排试点的进入建议。

澄安物业居家适老化改造业务市场进入研究

启动前确认：研究范围、访问渠道、资料权限与采购安排。

第4周提交阶段建议，第7周交付完整报告与经营测算。
